Bilaga 15 & 16

Prel. Huvudtidplan Röda Längan

ID	Uppgiftsnamn	Varaktighet	Start	Slut	Föregående aktiviteter
1	**Projekttid total**	**609 dagar?**	**on 19-05-01**	**må 21-10-25**	
2	**Projektering**	**285 dagar**	**on 19-05-01**	**ti 20-06-30**	
3	Programskede	83 dagar	on 19-05-01	fr 19-09-20	
4	Detaljplanen Laga Kraft	1 dag?	to 19-09-19	to 19-09-19	
5	Bygglov/ Systemhandling	90 dagar	må 19-09-23	fr 20-01-24	4
6	Försäljning	100 dagar	må 19-12-02	fr 20-04-17	
7	Bygghandling	112 dagar	må 20-01-27	ti 20-06-30	5
8	**Produktion**	**310 dagar**	**må 20-08-17**	**fr 21-10-22**	
9	**Mark och grund garage**	**100 dagar**	**må 20-08-17**	**fr 21-01-01**	
13	**Bergvärme**	40 dagar	må 20-08-17	fr 20-10-09	
14	**Stomme In/ Utv**	**290 dagar**	**må 20-09-14**	**fr 21-10-22**	
15	**Del 1**	**190 dagar**	**må 20-09-14**	**fr 21-06-04**	
16	Ställning/ Väderskydd	20 dagar	må 20-09-14	fr 20-10-09	10
17	Rivning Stomförstärkning	30 dagar	må 20-10-12	fr 20-11-20	16
18	Stomme	40 dagar	må 20-12-07	fr 21-01-29	17SS+40 dagar
19	Stomkomplettering	60 dagar	må 21-02-01	fr 21-04-23	18SS+40 dagar
20	Installationer	60 dagar	må 21-03-15	fr 21-06-04	19SS+30 dagar
21	**Del 2**	**190 dagar**	**må 20-10-12**	**fr 21-07-02**	
22	Ställning/ Väderskydd	20 dagar	må 20-10-12	fr 20-11-06	16
23	Rivning Stomförstärkning	30 dagar	må 20-11-09	fr 20-12-18	22
24	Stomme	40 dagar	må 21-01-04	fr 21-02-26	23SS+40 dagar
25	Stomkomplettering	60 dagar	må 21-03-01	fr 21-05-21	24SS+40 dagar
26	Installationer	60 dagar	må 21-04-12	fr 21-07-02	25SS+30 dagar
27	**Del 3**	**190 dagar**	**må 20-11-09**	**fr 21-07-30**	
28	Ställning/ Väderskydd	20 dagar	må 20-11-09	fr 20-12-04	22
29	Rivning Stomförstärkning	30 dagar	må 20-12-07	fr 21-01-15	28
30	Stomme	40 dagar	må 21-02-01	fr 21-03-26	29SS+40 dagar
31	Stomkomplettering	60 dagar	må 21-03-29	fr 21-06-18	30SS+40 dagar
32	Installationer	60 dagar	må 21-05-10	fr 21-07-30	31SS+30 dagar
33	**Del 4**	**190 dagar**	**må 20-12-07**	**fr 21-08-27**	
34	Ställning/ Väderskydd	20 dagar	må 20-12-07	fr 21-01-01	28
35	Rivning Stomförstärkning	30 dagar	må 21-01-04	fr 21-02-12	34
36	Stomme	40 dagar	må 21-03-01	fr 21-04-23	35SS+40 dagar
37	Stomkomplettering	60 dagar	må 21-04-26	fr 21-07-16	36SS+40 dagar
38	Installationer	60 dagar	må 21-06-07	fr 21-08-27	37SS+30 dagar
39	Slutskede	40 dagar	må 21-08-30	fr 21-10-22	20;26;32;38
40	**Inflyttning**	**1 dag?**	**må 21-10-25**	**må 21-10-25**	39
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					

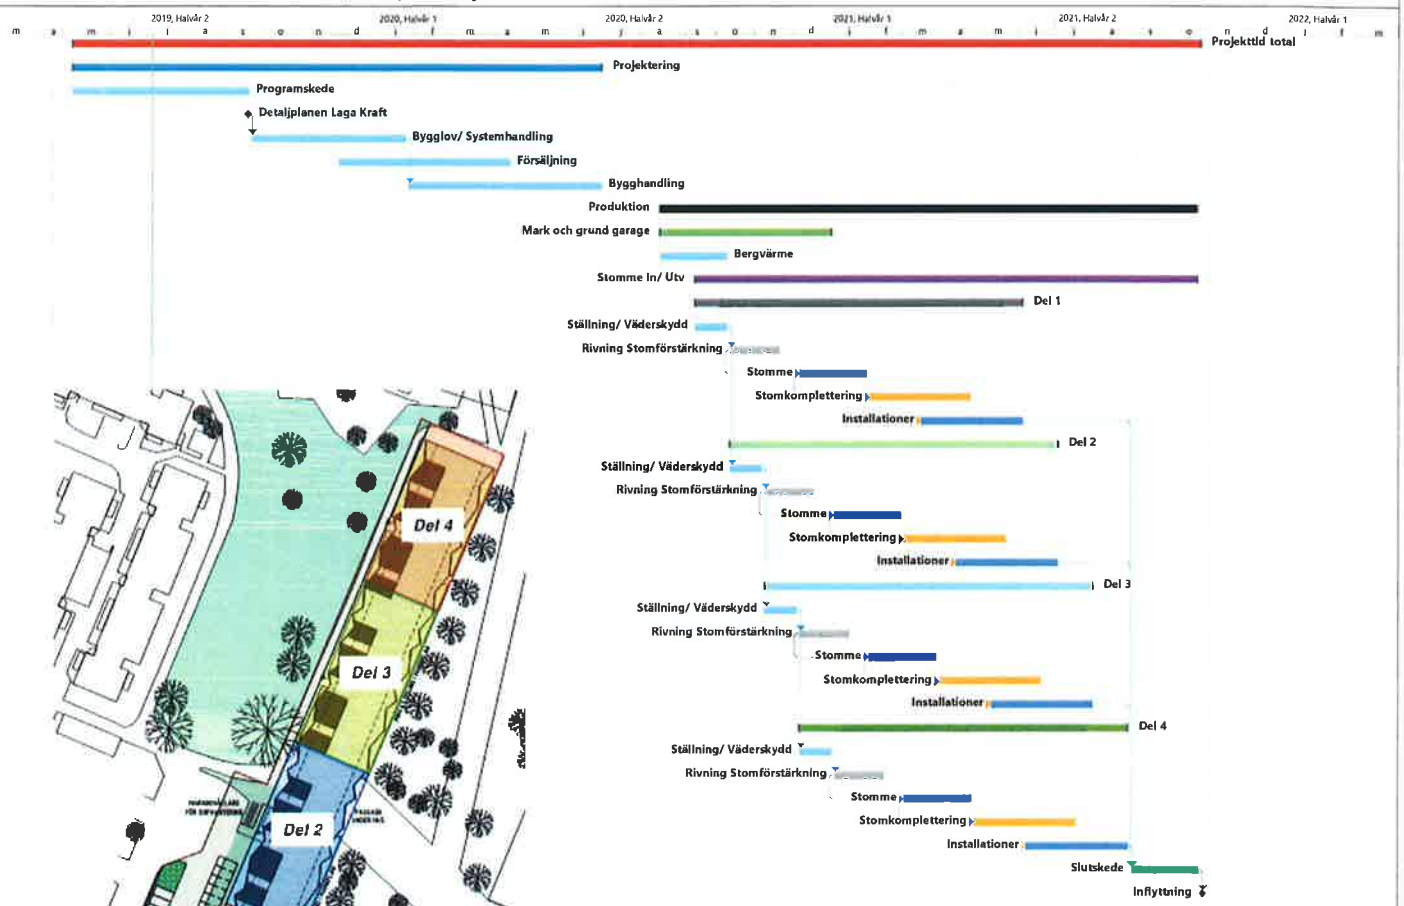

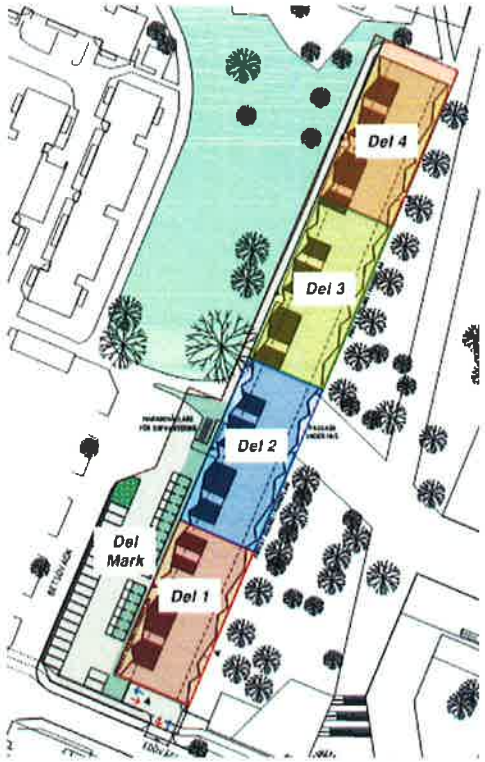

Röda Längan
2019-07-05

Task | Split | Milestone | Summary | Project Summary | Inactive Task | Inactive Milestone | Inactive Summary | Manual Task | Duration-only | Manual Summary Rollup | Manual Summary | Start-only | Finish-only | External Tasks | External Milestone | Deadline | Progress | Manual Progress
