| ID | Aktivitet |
|---|---|
| 1 | **Kvarnholmen ny förbindelse** |
| 2 | **Projektanalys** |
| 6 | Godkännande av start-PM |
| 7 | **Program** |
| 8 | Samrådshandling |
| 9 | Genomförandefrågor i Program |
| 10 | Kostnadskalkyl |
| 11 | Samrådsbeslut |
| 12 | **Samråd** |
| 18 | Programbeslut |
| 19 | Handla upp projektering och byggledning |
| 20 | FU förproj |
| 21 | Upphandling av förproj |
| 22 | **Förprojektering** |
| 23 | Förprojektering |
| 24 | Förkalkyl |
| 25 | Bullerberäkningar |
| 26 | **Förankring av förproj** |
| 33 | Upphandla gestaltning |
| 34 | Gestaltningsuppdrag |
| 35 | Förankring LST |
| 36 | **Detaljplan** |
| 37 | Samrådshandling |
| 38 | Genomförandebeskrivning |
| 39 | Samrådsbeslut |
| 40 | **Samråd** |
| 46 | **Utställning** |
| 55 | Antagandehandling |
| 56 | Upphandling projektering |
| 57 | **Projektering FU** |
| 61 | Kalkyl |
| 62 | **Avtal med intressenter** |
| 67 | **Beslut om genomförande** |
| 75 | **Miljödom** |
| 76 | Underlag till ansökan |
| 77 | Ansökan |
| 78 | Behandling |
| 79 | Dom |
| 80 | **Upphandling av entreprenad** |
| 88 | **Produktion** |
| 98 | **Bygglov** |
| 103 | **Fastighetsbildning** |
| 107 | **Projektavslut** |
| 113 | Öppen förbindelse |
| 114 | **Garantibesiktning** |
| 117 | Reservtid |

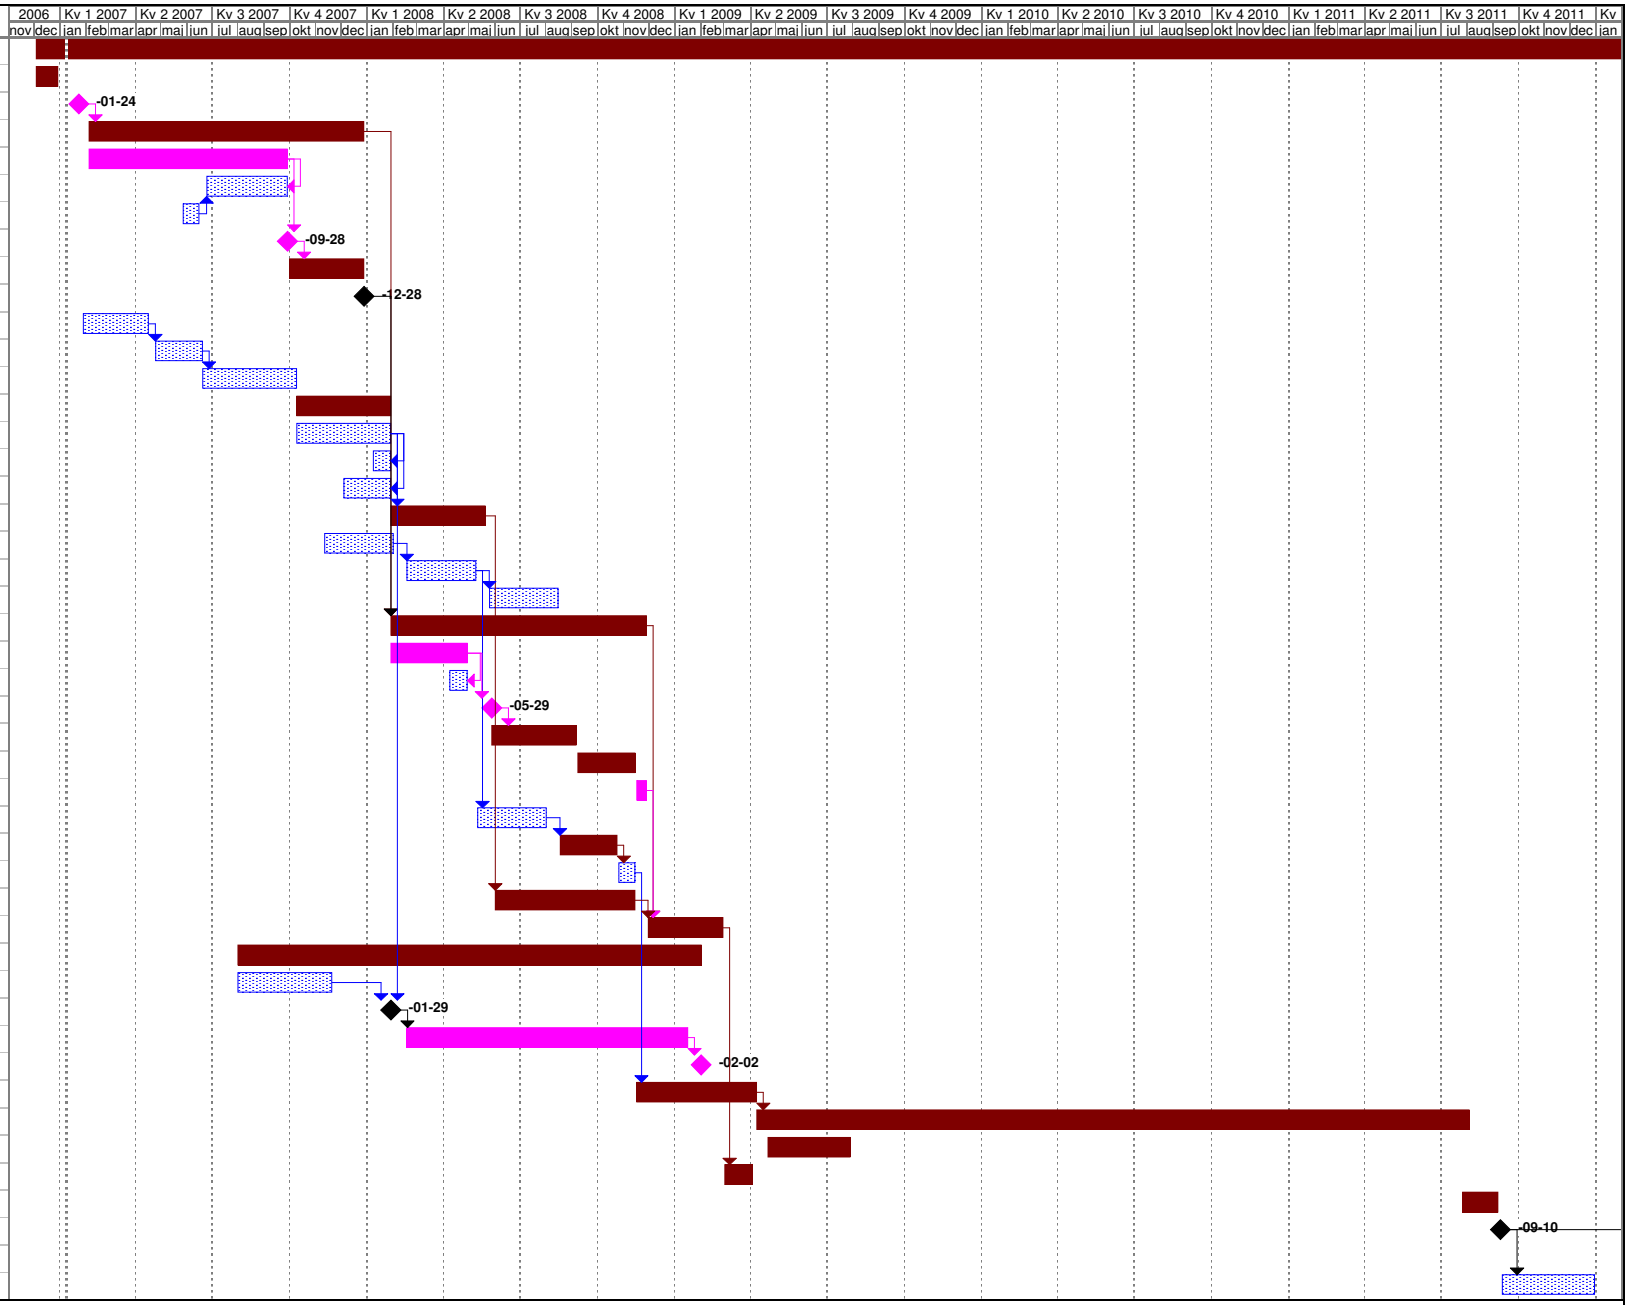


Projekt: Handlingsplaner
Datum: må 07-01-08

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktivitet | | Status | | Sammanfattning | | Externa aktiviteter | | Tidsgräns | |
| Delad | | Milstolpe | | Projektsammanfattning | | Extern milstolpe | | | |
